

**Státusz a
„Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projektről**

A projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007.



2023.05.18.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	2
1. ADATLAP	3
2. ELŐZMÉNYEK	4
3. A FEJLESZTÉS	4
4. KÖZPONTI INFORMÁCIÓS - KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET ÉS JÁTSZÓHÁZ (KGY1)	5
5. SÉTAÚTVONAL KIALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁS A KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN (KGY3). DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY FEJLESZTÉSE, FUTÓ- ÉS SÉTAÚTVONAL KIALAKÍTÁS, TÁJÉPÍTÉSZET (KGY2, KGY4).	6
6. ELEKTROMOS JÁRMŰVEK (KGY5), ELEKTROMOS ÖNEGYENSÚLYOZÓ GÉP ÉS KERÉKPÁROK. SEGWAY VEZETÉS TECHNIKAI ÉS TÚRAVEZETŐ KÉPZÉS (KGY6, KGY9) 7	7
7. MARKETING ELEMÉK ÉS ESZKÖZÖK (KGY7)	7
8. A SZAKMAI KÉPZÉS (KGY8)	7
9. A BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ESZKÖZÖK (KGY9)	8
10. WEB FEJLESZTÉSEK (KGY10)	8
11. KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG (KGY11)	10
12. ADMINISZTRÁCIÓ, PROJEKT MENEDZSMENT (KGY11)	8

Adatlap

A projekt azonosító száma:	GINOP-7.1.9-17-2018-00007
A projekt címe:	Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése
A Fő Kedvezményezett neve:	Kehidakustány Község Önkormányzat
A Konzorciumi Partner neve:	Magyar Turisztikai Ügynökség
Projekt tényleges kezdete:	2019.02.01.
Projekt várható fizikai befejezésének dátuma:	2023.10.30
A projekt költségvetése	524.250.352 Ft ¹
Támogatási aránya	100%
Státusz elkészítésének időpontja:	2023.05.18.

¹ Pénzügyi tábla 1.sz. melléklet

Előzmények

Kehidakustány Község Önkormányzata feladatai között kiemelten szerepel a gyógyturizmus, illetve általában a turizmus helyi feltételrendszerének megteremtése, az infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a turizmus szervezése. Ezért a „Nemzeti Turizmusfejlesztési stratégia 2005-2013” -ban megfogalmazott alapelvek és módszertan alapján 2010-ben létrehozott Kehidakustányi Turisztikai Egyesületen keresztül lát el ezeket a feladatokat. Az Önkormányzat 2012-ben az egységes turisztikai irányítás és tervezés érdekében elhatározta, hogy a következő időszakra szükségesnek megalkotni Kehidakustány Integrált Településfejlesztési Koncepcióját, melynek tartalmaznia kell a turizmus fejlesztési célokat is. A munka és a fejlesztési erőforrások hajtóereje így fókuszálható lesz. A fejlesztési dokumentum fő célja, hogy rendszerszintű stratégia irányokat, és forrás allokációkat jelöljön ki Kehidakustány fejlődéséhez. Ebben kiemelten a település turizmusának megújulását előre vetítő jövőképpel. A koncepció a futó tervezési időszakra szóló fejlődési irányokat és célkitűzéseket is megjelölte.

A dokumentummal létrejött egy egységes, az országos programokhoz és stratégiákhoz illeszkedő Kehidakustány fejlődését hosszútávon tervező és megvalósítását leíró településfejlesztési koncepció.

A fejlesztés

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül a Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése tárgyú felhívásban GINOP-7.1.9- 17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projektjének 2023.05.18 -i állapotának összefoglalója. A projektet Kehidakustány Község Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökséggel konzorciumi partnerségben valósítja meg. A projekt kezdete 2019.02.01, befejezése: 2023.10.30.-ra várható.

A fejlesztés keretében megvalósuló gyógyhelyfejlesztési projekt közvetlen céljai:

- a gyógyhely településképezetének minőségi fejlesztése,
- vendéginformációs tevékenység fejlesztése,
- komplex turisztikai kínálat kialakításának elősegítése termékfejlesztéssel
- összehangolt, integrált marketingtevékenység megvalósítása
- a helyi és regionális kézműves hagyomány termékeinek bemutatása, értékesítése, tematizált események szervezése.

Ezeknek a céloknak a megvalósításán keresztül olyan közvetetten értelmezhető eredmények várhatók a projekttől, mint a meglévő fő attrakciók látogatottságának növelése, a vendégéjszaka- szám tartós növekedésének a fenntartása, a növekedési ütem lassulásának ellensúlyozása, a szezonális csökkenés és a helyi és térségi turisztikai szereplők és egyéb vállalkozások közötti kapcsolatrendszer erősítése, kiterjesztése. Hosszútávon megvalósul a turisztikai kínálat komplexitásának erősítése, a turizmus fenntartható fejlesztése gazdasági, természeti és társadalmi értelemben egyaránt. Erősíti Kehidakustány gyógyhely jellegét, valamint a desztináció országos és nemzetközi jelentőségét és piaci pozícióját, nem utolsósorban pedig növeli Kehidakustány ismertségét, imázsát és vonzerőjét. A turizmus helyi szinten történő hatékonyabb megszervezése révén koordináltabb és fenntarthatóbb a turisztikai termékfejlesztés, hatékonyabb a marketing kommunikáció, a turisták fogadására felkészültebb humán erőforrás áll rendelkezésre. A “márkásabb”, a vonzóbb-karakteresebb desztináció, a szolgáltatások jobb ár érvényesítő képessége, a magasabb vendég- és vendégéjszaka-szám, a turizmus erősebb jövedelme termelő képessége, a szezonálisan kiegyensúlyozottabb kereslet, a turisták tartózkodásának tartalmasabbá válása és a visszatérési

4

Státusz jelentés a Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal projektről.

2023.05.18.

hajlandóságuk növekedése, végtére is a turizmus multiplikatív hatása révén a helyi-térségi gazdaság megerősödése és a térség népességmegtartó erejének és életminőségének javulása érhető el.

Projekt előkészítés (KGY0)

A projekt előkészítés során (2015.- 2018.) Kehidakustány Község Önkormányzat részről a menedzsment a fejlesztési stratégia és a pályázati elvárások ismertetésében megkezdi a fejlesztés előkészítését. Az előkészítés részét képezi a gyógyhelyé minősítés előkészítése, véghezvitele, a résztvevő szakértők (tervező, építész, jogász) kiválasztása. A pályázat benyújtása előtt kötelezően elkészítendő dokumentumok előállítás. A konzorciumi partnerrel szakmai egyeztetések lefolytatása. Pályázat benyújtása.

Státusz: Elkészült 100%, elszámolásra benyújtva: 2022.03.18

Központi információs - közösségi épület és játszóház, elektromos töltőfejek (KGY1, KGY4)

A Kehidakustány 750/4 hrsz területen egy komplex turista információs és szolgáltató épület felépítése került megtervezésre. Az épületben az következő funkciók kerülnek kialakításra: Információs és közösségi tér helyi termék bolttal, valamint az ezekhez tartozó kiszolgáló funkciók kapnak helyet. Itt kerül kialakításra a gyermek játszóház, illetve a bérelhető elektromos kisbusz, kerékpárok és segwayek. Az épületben a földszinten kap helyet a játszóház, ami a közösségi térből nyílik majd. A közösségi térben kerülne kialakításra az információs iroda és a helyi termék bolt. A két egység egy légtérben kerül kialakításra. Az emeleti részen 2 db iroda és egy tárgyaló és helyi értékeket bemutató galéria kerül kialakításra.

Státusz: információs épület folyamatban van 40 %, játszóház 0%, elektromos töltőfejek felszerelésre várnak 74%. Részelszámolásra benyújtva: 2022.03.18

A 3. közbeszerzési eljárás és az utóellenőrzés eredményes lezárulta után 2021 július 30.-án megkötésre került a feltételes kivitelezői szerződés. A szerződés csak a benyújtott kiegészítő forrás jóváhagyása után lépett hatályba. A 2022.02.16-i magyar közlönybe megjelent a Kormány 1061/2022. (II.15.) számú határozata, melyben az igényel kiegészítő forrást jóvá hagyta. A kivitelezői szerződés a megkötését követő 7. hónapban hatályba lépett. A kivitelezőnek a munkaterület 2022-02-24. napján átadásra került. A kivitelező a munkálatokat megkezdte a részére biztosított előleggel (55.497.249 Ft).

A munkálatok 2022.augusztus 31-én leálltak, mert a Kormány 1061/2022. (II.15.) számú határozatában foglaltan többlettámogatás határidőre (2022.03.31.) nem érkezett meg. A munkálatok a forrás megérkezése után (2023. március 13.), és a szerződéses állapot rendezése után 2023 május 8-án megkezdődtek. Az épület jelenleg 40 %-os készütségekben van.

Az épülethez kapcsolódó elektromos töltőállomás kiépítéshez a töltő egységek összes alkatrésze beszerzésre került. A telepítési munka az építési munkálatokkal párhuzamosan történik majd meg. Az épület műszaki átadásának jelenlegi határideje: 2023.október 1.

A projekt elem ismét forrás hiányos ca. 117.000.000. Ft összegben. A 2023-ra hiányzó forrás kialakulásának okai:

- A Kormány az 1061/2022. (II.15) számú határozatában (2022. február 16-án) megítélt összege a megjelölt 2022. március 31.-i határidőig nem került átutalásra.

- A 2022. június és 2023. február 16. között szabálytalansági gyanú ellenőrzés miatt a kivitelezés és így a projekt is teljesen ellehetetlenült.
- a KSH nyilvános adatai szerint (https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0031.html - épületek építése oszlop) 2021-2022. év között 26,7%-os emelkedés volt. Ezt követően a jenlegi napig - és a megvalósítás időszakát figyelembe nem véve – (https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0062.html) további 26% emelkedés történt az építőipari árakban. Így 2 év alatt együttesen 52,7% körül volt az áremelkedés mértéke.

A projekt a szabálytalansági eljárás nélkül már elkészült és elszámolásra is került volna, aminek köszönhetően Kehidakustány az idei évben nagyságrendileg színvonalasabb körülményének között tudná fogadni a vendégeket.

A szabálytalansági eljárás kezdeményezőjének köszönhetően a projekt megvalósítása közel egy éves csúszásba került, ami újabb 117 M Ft-os többletköltséget okozott, amiről részletes kivitelezői költségvetés készült. Jelenleg ennek a többletforrásnak a bevonásán dolgozik a projektmenedzsmen a Miniszterelnökséggel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen. Haladás az Irányító Hatóság döntése után lehetséges, melyről a jelentés készítéskor hivatalos információkkal nem rendelkezünk.

Sétaútvonal kialakítása, felújítás a Kossuth Lajos utcában (KGY3). Dr. Kovács Lajos sétány fejlesztése, futó- és sétaútvonal kialakítás, tájépítészet (KGY2).

A fejlesztési elem egyrészt a Dr. Kovács Lajos sétányt érinti, amely a Fürdő területét nyugati irányban határolja, így a sétány közvetlenül a Fürdő mellett halad el. A Fürdő kerítése beljebb került, az ehhez szükséges terület a Fürdő által bérelt, önkormányzati tulajdonú telekből lett leválasztva és átsorolva a sétány területéhez, így a gyógyhelyi sétány a jelenleginél szélesebb és biztonságosabb lesz, hogy az utcabútorok és más közterületi installációk megfelelő elhelyezése biztosított legyen. A gyógyhelyi területnek a sétány végéhez kapcsolódó nyitott területen, a Fürdő déli oldalához illeszkedve lesz kialakítva a rekreációs park. A sétány északi bejáratának folytatásában kapcsolódik a Kossuth Lajos utcai járdához. Így együtt az egy aktív turisztikai hálózat első szakasza jön létre.

Státusz: Folyamatban van, 75%, részelszámolásra benyújtva: 2022.03.18

A sétányfejlesztés első szakasza a Kossuth Lajos utcai járda felújításával valósult meg. A sétány fejlesztés 2020. július 1-én fejeződött be és így a kivitelezésnek köszönhetően a Kossuth Lajos utca gyógyhelyre eső részén 763m járda újult meg.

A Dr. Kovács Lajos sétány közbeszerzésének lezárulta után 2021.01.05-én megkötésre kerül a kivitelezői szerződés. Ezután a kivitelezés megkezdődött. Ennek eredményeként újabb járda szakasz, parkolók, közpark és sport elemek épülnek a gyógyhelyi területen. A sétány kivitelezésekor a műszaki ellenőr felhívására a gyalogos közlekedés, valamint a közúti közlekedés biztonságos megvalósítása került előtérbe. Ezért a tervezett közút szűkítéses és felfestéses járda kialakítás helyett egy magasabb műszaki tartalmú, biztonságosabb rész került kialakításra. A kialakítás lehetővé tesz, hogy a későbbiekben térkö burkolatot kapjon a közúttól teljes elkülönülő rész. A fejlesztés keretében az információs épület mellett kialakításra kerülő park és parkoló az épülettel elkészülte után folytatódott volna. Az információs épület jelenlegi készültsége nem teszi lehetővé a munka folytatását, befejezését.

Elektromos járművek (KGY5), elektromos önegyensúlyozó gép és kerékpárok. Segway vezetés technikai és túravezető képzés (KGY6, KGY9)

A településen és környezetében egymástól viszonylag nagy távolságra található vonzerők és szolgáltatások környezetbarát megközelítésének biztosítása elektromos kisbusz segítségével, illetve főleg a bor-gasztrónómiai programokhoz kapcsolódva a transzferlehetőséget biztosítja. Az elektromos önegyensúlyozó gép (Segway) és a kerékpárok lehetőséget teremtenek a termékfejlesztésre, programszervezésre is. A növekvő mobilitási igény ezekkel az eszközökkel ugyanakkor nem jár együtt a település környezeti terhelésével.

Státusz: Elkészült 100 %, elszámolásra benyújtva: 2022.03.18

Beszerezésre került 1db 11 személyes kisbusz és 1db 2 személyes technikai jármű. A járművek 2020 júniustól megkezdtek a próbaüzemet, mely sikeresen zárult. Az elektromos önegyensúlyozó gép és kerékpárok beszerzésük 2021 márciusában megvalósult. Az eszközökhöz előírt túra vezetői képzésen 4 fő szerezte meg a jogosultságot. A 10 db kerékpár beszerzése is megvalósult, a kiegészítő eszközökkel együtt. A járművek 2021 májusától megkezdtek a próbaüzemet, mely sikeresen zárult. A járművek a 2021. őszétől az eszközök a raktárakban álltak. 2022-ben a eszközök továbbra is a raktárban álltak. Ennek következményeire a menedzsmnt folyamatosan felhívta a kedvezményezett figyelmét. Sajnos az eszközök közül az elektromos kisbusz akkumulátor hiba miatt jelenleg használhatatlan.

Marketing elemek és eszközök (KGY7)

A létrejövő új vonzerők, szolgáltatások piacra lépésének ösztönzése, a fenntartható üzemeltetés elindítása. Egy erős márka nem alakulhat ki erős és kellően megtervezett marketing kommunikáció nélkül. A humánerőforrás és a fogadóhely turisztikai attrakcióihoz kapcsolódó marketing és promóciós eszközök fejlesztésével egységesebb, intenzívebb és hatékonyabb kommunikáció valósul meg, ezért az utazás tervezési fázisában a potenciális turista a jelenlegihez képest lényegesen széleskörűbb, ugyanakkor szűrhetőbb és strukturáltabb, összességében vonzóbb formában célzott információval rendelkezik a gyógyhelyről, ami a Kehidakustány melletti döntést támogatja.

Státusz: Elkészült 100 %, elszámolásra benyújtva: 2022.03.18

A marketing elemek és eszközök beszerzése megvalósult és a feladatok végrehajtásra kerültek 2021.12.31 napig.

A szakmai képzés (KGY8)

A projekt során megvalósult képzés a fejlesztés eredményeképpen létrejövő turisztikai szolgáltatás végzéséhez, üzemeltetéséhez, elsősorban a látogató menedzsmnt részhez szükséges.

Státusz: Elkészült 100 %, elszámolásra benyújtva: 2022.03.18

A szakmai képzés keretében a kommunikációs és turizmus szakmai képzés 2020 júliusban befejeződött. A képzés során a résztvevők az alábbi témákban szereztek meg a szükséges tudást: kommunikáció, vevő tipológia, konfliktuskezelés, problémás ügyek, nehéz helyzetek és problémás vendéggel való bánásmód a

gyakorlatban, a recepció és sales csapat feladata, marketing eszközök a turizmusban. A résztvevők a vizsga teljesítése után megkapták a szükséges tanúsítványokat.

A berendezési tárgyak és biztonságtechnikai eszközök (KGY9)

Központi információs és fogadóépület különböző, összesen 25 féle berendezési és felszerelési tárgyának (bútorok, konyhai eszközök, egyéb eszközök) szállítása és helyszíni összeszerelése.

Központi információs és fogadóépület biztonságtechnikai eszközeinek (riasztó, füstérzékelő, kamerák, kapcsolódó IT eszközök, egyéb eszközök) szállítása és helyszíni összeszerelése.

Státusz: Elkészült 90 %, eszközök beépítésre várnak. Részelszámolásra benyújtva: 2022.03.18

Az információs épület berendezési tárgyai és biztonságtechnikai eszközök beszerzése megtörtént. A vállalkozókkal a szerződéskötések 2020-ban megtörténtek. A biztonságtechnikai eszközök leszállításra kerültek. Ezek helyszíni telepítés az építési munkálatokkal párhuzamosan történik majd meg. A berendezési tárgyak vonatkozásában a szállítás megtörtént a beszerelés az információs épület elkészülte után lesz lehetséges.

Web fejlesztések (KGY10)

A www.kehidakustany.hu és a www.kehidakustanytdm.hu átalakítása, új tartalmi elemek létrehozása: interaktív térkép, útvonaltervező, aktuális időjárás panel, program ajánló integrálása helyi és térségi szinten. A 2 db domain használata a mai online igények és trendeknek megfelelően: beágyazott facebook ablak, socialmedia linkelés, web analitika. A weboldalak magyar nyelvű részének a gyengén látók részére is elérhetőnek és használhatóknak kell lennie. Az oldal összekapcsolás Facebook és Instagram oldallal. Dinamikus, reszponzív oldal létrehozása, tartalmi feltöltése és optimalizálása. Az oldalaknak az arculat fejlesztés során elkészült arculati elemeket kell használniuk.

Státusz: Elkészült 100 %, elszámolásra benyújtva: 2022.03.18

A fejlesztés eredményeként teljesen megújult és egy platformra kerül a www.kehidakustany.hu és a www.kehidakustanytdm.hu weboldalak. Elkészül a „Kehidakustány” applikáció, melynek segítségével könnyebben informálódhatnak a településre látogatók.

Adminisztráció, projekt menedzsment, közbeszerzés (KGY11, KGY12)

A projekt előkészítése 2015-2018 között, majd pályázat benyújtás. 2019. fejlesztés megkezdése, 2020-21-ben a fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások és a megvalósítások végrehajtása, dokumentálása. Ennek keretében a 18 db eljáráshoz szükséges adminisztratív feladatok kerültek elvégzésre. A közbeszerzések Nemzeti eljárásrendben, a Kbt. 115 §, Kbt. 113§ és a Kbt. 112 § szerinti eljárásaiban kerültek megvalósításra. A közbeszerzési jogi feladatait közbeszerzési jogász végezte. A közbeszerzési eljárások utóellenőrzése 2021. márciusában indult és 2021. októberben lezárult. A közbeszerzési eljárások háttér adminisztrációját a közbeszerzési jogász és a projekt menedzsment kedvezményezettje oldala végezte.

Státusz: Elkészült 100 %, elszámolásra benyújtva: 2022.03.18

A projekt menedzsment feladatokat 2022-ben Kehidakustány Község Önkormányzat részről: Urbán Tibor projekt vezető, Víg Tamás gazdasági menedzser, Lázár Roland szakami menedzser, a Magyar Turisztikai Ügynöksége részéről: Magyar Márton EPM igazgató, Farkas Piroska menedzser és Cservenyné Tóth Ildikó menedzser végezte. 2023-ban a Magyar Turisztikai Ügynöksége részéről Kovács Dániel Zolt EU projektekért felelős igazgató és Laczkó Dóra projekt menedzser vette át.

Kedvezményezett oldalán a projekt menedzsment a projektet folyamatosan követte a Támogatási Szerződés módosításokkal és a menedzsment feladatok ellátásával. A menedzsment 2021. márciusától a fejlesztési program plusz forrás támogatásnak biztosítsa érdekében jelentős energiákat mozgató meg, melynek eredményeként a Kormány 1061/2022. (II.15.) számú határozatában foglaltan többlettámogatás folyósításáról döntött.

A Kehidakustány Község Önkormányzat részről a menedzsment 2019.02.01 és 2021.12.31 között a projekt költségvetésből 3,21% -ot használt fel a bérköltségekre, mely tartalmazza az összes járulékot és adót is. A menedzsment költségek a projektet terhelik 100%-ban. A kedvezményezett Kehidakustány Község Önkormányzat részről a menedzsment 2021.12.31-től díj nélkül végzi a munkáját.

A menedzsment 2022. márciusban benyújtott az addig elvégzett fejlesztési elemek elszámolást az Irányító Hatóság felé 325.719.135 Ft összegben. A Kormány 1061/2022. (II.15.) számú határozatában foglaltan többlettámogatás határidőre (2022.03.31.) nem érkezett meg kedvezményezett Kehidakustány Község Önkormányzat elkülönített számlájára. A menedzsment a 2022.04.07 a helyszíni monitorig látogatáson az Irányító Hatóság képviselői részére bemutatta a projekthez kapcsolódó valamennyi helyszínt, eszközt, projekt dokumentációt. A monitorig látogatáson felmerült kérdésekre határidőre írásban válaszolt a menedzsment.

Szabálytalansági eljárás

2022.04.07-én Monitoring látogatást végeztek a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság munkatársai. A Monitoring látogatás során a megjelentek úgy nyilatkoztak, hogy a látogatás célja a záró ellenőrzésre való felkészítés, a 2022.03.18-án benyújtott 5. időközi elszámolás hiánypótlása nem kapcsolódik a tevékenységükhöz, tehát az elszámolás kapcsán felmerült anomáliák tisztázása nem feladatuk. A látogatáson ennek ellenére felmerültek olyan elemek, mely az 5. időközi elszámoláshoz kapcsolódtak. Monitoring látogatás során felmerült és helyben kezelhető kérdések mellett hiánypótlás került kiírásra, melyet a jegyzőkönyv tartalmazott. A hiánypótlás sajnos nem az EPTK rendszerén keresztül zajlott, ami ekkor csak furcsának tűnt. A hiánypótlás határidőre megküldésre került e-mailen keresztül az ellenőrzési referens részére.

A hiánypótlás után az önkormányzat az irányító hatóság 2022.06.20-i keltezésű levelében jelezte, hogy a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 159.§ (3) bekezdés alapján szabálytalansági gyanúval eljárást indít a projekttel szemben a 2022.04.07-én megtartott Monitoring látogatás kapcsán, mely szerint nem tettünk eleget teljeskörűen a hiánypótlási kötelezettségünknek. A kifogásolt hiánypótlást hiányosnak, vagy nem megfelelőnek minősítették. Ezzel szemben a hiánypótlás határidőre beküldésre került a Monitorig látogatáson részt vevő ellenőrzési referens részére, aki ezt vissza is igazolta. Az elrendelt szabálytalansági eljárásában olyan pénzügyi elszámoláshoz kapcsoló részeket vizsgáltak, melyek a benyújtott 5. időközi elszámoláshoz kapcsolódnak és melyhez nem biztosították a 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 132.§ (1), (3) pontjában meghatározottakat. A 2022. június és 2023. február 16. között lefolytatott ellenőrzés során a vonatkozó szabályok egyoldalú értelmezése után szabálytalanságot állapítottak meg. A szabálytalanság

megállapításával számszerűsített 7.322.956 Ft összegben olyan költség tételeket vontak el a projektől, melyekről nyilatkoztunk, hogy nem kívánjuk elszámolni, illetve elszámolható tételek.

A 2022. június és 2023. február 16. között lefolytatott szabálytalansági gyanú ellenőrzés miatt a kivitelezés és így a projekt is teljesen ellehetetlenült, jelentős plusz forrás igény keletkezett. A szabálytalansági eljárással szemben jogi lépések előkészítése zajlik, melynek végén a szükséges jogi, közigazgatási eljárások megindításra kerülnek.

Kötelező nyilvánosság (KGY15)

A projekt megkezdése után a kötelező nyilvánosság biztosítását saját teljesítésben valósítja meg a kedvezményezett. A <http://kehidakustany.hu/kehidakustany-gyogyhelyfejlesztese/online> tájékoztató oldal A települési és térségi újságban (Hírmondó, Zala-Völgye magazin) is folyamatosan tájékoztatást kapnak a település lakói és a turisták a fejlesztéshez kapcsolódó eseményekről. Elkészültek a tájékoztató táblák is. A kötelező nyilvánosság megvalósítása során folyamatos a fotódokumentáció készítése is.

Státusz: Elkészült 80 %, részelszámolásra benyújtva: 2022.03.18

Költség kimutatás export GINOP-7.1.9-17-2018-00007 - 2023.05.19 15:21:15

	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér, hintó	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák	Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése	Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége	Marketing tevékenység	Marketing tevékenység-nyomatott kiadvány	Nyilvánosság biztosítása	Végösszeg
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	3 048 000 Ft	294 985 258 Ft		21 488 938 Ft	1 315 750 Ft	31 010 682 Ft	19 996 150 Ft	18 915 380 Ft		54 019 950 Ft					444 780 108 Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	3 048 000 Ft	294 985 258 Ft						18 915 380 Ft		54 019 950 Ft					370 968 588 Ft
Eszközbeszerzés költségei				21 488 938 Ft	1 315 750 Ft	31 010 682 Ft									53 815 370 Ft
Immateriális javak beszerzése							19 996 150 Ft								19 996 150 Ft
Projektelőkészítés költségei			28 702 000 Ft												28 702 000 Ft
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei			22 733 000 Ft												22 733 000 Ft
Közbeszerzési költségek			5 969 000 Ft												5 969 000 Ft
Projektmenedzsment költség								13 082 194 Ft							13 082 194 Ft
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása								13 082 194 Ft							13 082 194 Ft
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei											2 387 600 Ft	30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	298 450 Ft	37 686 050 Ft
Képzéshez kapcsolódó költségek										2 387 600 Ft					2 387 600 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége														298 450 Ft	298 450 Ft
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei												30 000 000 Ft	5 000 000 Ft		35 000 000 Ft
Végösszeg	3 048 000 Ft	294 985 258 Ft	28 702 000 Ft	21 488 938 Ft	1 315 750 Ft	31 010 682 Ft	19 996 150 Ft	18 915 380 Ft	13 082 194 Ft	54 019 950 Ft	2 387 600 Ft	30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	298 450 Ft	524 250 352 Ft

Eljárás EKR azonosító	Ajánlatkérő szervezet neve	Hirdetmény iktatószáma	Eljárás tárgya	Eljárás fajtája	Eljárás megindításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza	
EKR000355452021	Kehidakustány Község Önkormányzata	9327/2021 7623/2021	Központi információs és közösségi épület építése	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021.05.05	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	1
EKR001241192020	Kehidakustány Község Önkormányzata	4041/2021 22402/2020	Elektromos öngyensúlyozó gép és kerékpárok -újra3	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.12.01	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	2
EKR001156472020	Kehidakustány Község Önkormányzata	0463/2021	Dr. Kovács Lajos sétány fejlesztése, tájépítészet	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020.11.18	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	3
EKR000762432020	Kehidakustány Község Önkormányzata	21696/2020 15693/2020	Elektromos öngyensúlyozó gép és kerékpárok - újra	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.08.31	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	4
EKR000762052020	Kehidakustány Község Önkormányzata	20277/2020	Központi információs és közösségi épület, sétány	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020.08.13	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	5
EKR000277512020	Kehidakustány Község Önkormányzata	13413/2020	Központi információs és közösségi épület, sétány	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020.06.12	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	6
EKR000413682020	Kehidakustány Község Önkormányzata	13818/2020 9195/2020	Marketing 2 szolgáltatások - újra	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.05.22	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	7
EKR000118972020	Kehidakustány Község Önkormányzata	15502/2020 6810/2020 6295/2020 5706/2020 4623/2020	Berendezési tárgyak és biztonságtechnikai eszközök	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.03.19	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	8
EKR000118802020	Kehidakustány Község Önkormányzata	5183/2020 4043/2020	Marketing 2 szolgáltatások - újra	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.03.11	Visszavont közbeszerzési eljárás	9
EKR001096042019	Kehidakustány Község Önkormányzata		Berendezési tárgyak és biztonságtechnikai eszközök	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.11.28	Visszavont közbeszerzési eljárás	10
EKR001236752019	Kehidakustány Község Önkormányzata	1691/2020	Marketing 2 szolgáltatások	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.12.04	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	11
EKR001496172019	Kehidakustány Község Önkormányzata	3753/2020	Elektromos kisbusz és autó beszerzése	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.11.29	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	12
EKR001470242019	Kehidakustány Község Önkormányzata	8436/2020	Elektromos öngyensúlyozó gép és kerékpárok	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.11.28	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	13
EKR001096112019	Kehidakustány Község Önkormányzata	2764/2020	Marketing 1 szolgáltatások	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.10.07	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	14
EKR001102572019	Kehidakustány Község Önkormányzata	1545/2020	Infokommunikációs fejlesztés webes eszközön	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.09.10	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	15
EKR001095702019	Kehidakustány Község Önkormányzata	21747/2019	Elektromos öngyensúlyozó gép és kerékpárok	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019.09.11	Eredménytelen közbeszerzési eljárás	16
EKR001141102019	Kehidakustány Község Önkormányzata	20568/2019	Járdafelújítás a Kossuth Lajos utcában	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019.09.04	E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz	17
EKR001086722019	Kehidakustány Község Önkormányzata		Járdafelújítás a Kossuth Lajos utcában	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019.08.21	Visszavont közbeszerzési eljárás	18


Költség kimutatás export GINOP-7.1.9-17-2018-00007 - 2023.05.19 15:21:15

Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Beszerezés jellege	Elszámolási mód	Mérföldkö hozzárendelése	Nettó egységár	Nettó egységára jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási százalék	Támogatási összeg	Részletezés	Megvalósítási helyszín
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítésével kapcsolat os tevékenység	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		11 800 000 Ft	3 186 000 Ft	14 986 000 Ft	1	11 800 000 Ft	3 186 000 Ft	14 986 000 Ft	14 986 000 Ft	0	100	14 986 000 Ft	Projekt előkészítés, tervezés, felépítéssel tervek és kapcsolódó építészeti előkészítés költsége.	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Gyógyhely fejlesztési stratégia	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		- Ft	- Ft	- Ft	1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	100	- Ft	Gyógyhely-fejlesztési stratégia elkészítésének díja. NEM ELSZÁMOLHATÓ SZABÁLYTALANSÁG MIAATT	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Építéshoz kapcsolódó költségek	Sétányfejlesztés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		42 535 450 Ft	11 484 500 Ft	54 019 950 Ft	1	42 535 450 Ft	11 484 500 Ft	54 019 950 Ft	54 019 950 Ft	0	100	54 019 950 Ft	Gyógyhelyi sétány kialakítása, rekreációs park kialakítása, száraz Kneipp-sétány, szabadterei fitness, pihenő és rekreációs pontokkal.	8784 Kehidakustány dr. Kovács Lajos sétány 750/4,782/2,782/1
Építéshoz kapcsolódó költségek	E-töltőállomás kialakítása	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		3 936 956 Ft	1 062 978 Ft	4 999 934 Ft	1	3 936 956 Ft	1 062 978 Ft	4 999 934 Ft	4 999 934 Ft	0	100	4 999 934 Ft	E-töltőállomás kialakítása az elektromos eszközök részére. A töltőállomások a központi információs épületnél kerülnek kialakításra. (Dr. Kovács Lajos sétány)	8784 Kehidakustány dr. Kovács Lajos sétány 750/4
Építéshoz kapcsolódó költségek	Interaktív gyermek épületrész kialakítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		14 894 000 Ft	4 021 380 Ft	18 915 380 Ft	1	14 894 000 Ft	4 021 380 Ft	18 915 380 Ft	18 915 380 Ft	0	100	18 915 380 Ft	Játsszóház fejlesztése	8784 Kehidakustány dr. Kovács Lajos sétány 750/4
Építéshoz kapcsolódó költségek	Központi információs épület	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		188 402 100 Ft	50 868 568 Ft	239 270 668 Ft	1	188 402 100 Ft	50 868 568 Ft	239 270 668 Ft	239 270 668 Ft	0	100	239 270 668 Ft	Központi információs és közösségi célú épület kialakítása.	8784 Kehidakustány dr. Kovács Lajos sétány 750/4
Építéshoz kapcsolódó költségek	Tartalék	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		1 574 810 Ft	425 190 Ft	2 000 000 Ft	1	1 574 810 Ft	425 190 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0	100	2 000 000 Ft	Tartalék	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Építéshoz kapcsolódó költségek	Futó- és sétaútvonal kialakítása, felújítása	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		39 932 800 Ft	10 781 856 Ft	50 714 656 Ft	1	39 932 800 Ft	10 781 856 Ft	50 714 656 Ft	50 714 656 Ft	0	100	50 714 656 Ft	Az attrakció megközelítéséhez használt útvonalak, fejlesztése, a gyalogos útvonalak megfelelő információs táblákkal történő jelölése	8784 Kehidakustány Kossuth Lajos utca 0215/2-4,
Építéshoz kapcsolódó költségek	Megközelíthetőséget és bemutatás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		1 048 000 Ft	- Ft	1 048 000 Ft	1	1 048 000 Ft	- Ft	1 048 000 Ft	1 048 000 Ft	0	100	1 048 000 Ft	Elérhetőséget, megközelíthetőséget és bemutatást javító fejlesztés	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Eszközbeszerzés költségei	Kerékpár beszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		1 036 024 Ft	279 726 Ft	1 315 750 Ft	1	1 036 024 Ft	279 726 Ft	1 315 750 Ft	1 315 750 Ft	0	100	1 315 750 Ft	kerékpár beszerzés, nem elszámolható 184 150 Ft a szab miatt	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Eszközbeszerzés költségei	Központi információs - fogadóépület eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		11 811 024 Ft	3 188 976 Ft	15 000 000 Ft	1	11 811 024 Ft	3 188 976 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0	100	15 000 000 Ft	Fogadóépület eszközbeszerzés, kitelepülő pavilonok, asztalok, székek, szekrények, poharak stb. Az eszközbeszerzése a megvalósuló épület berendezései, melyek nélkül a tervezett funkciók nem működtethetők. teljes költség bruttó 15 491 955 Ft	8784 Kehidakustány dr. Kovács Lajos sétány 750/4
Eszközbeszerzés költségei	Segway beszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		15 743 000 Ft	4 250 610 Ft	19 993 610 Ft	1	15 743 000 Ft	4 250 610 Ft	19 993 610 Ft	19 993 610 Ft	0	100	19 993 610 Ft	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású, nem kategorizált jármű beszerzése	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Eszközbeszerzés költségei	Elektromos kisbusz, elektromos autó beszerzése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		8 674 860 Ft	2 342 212 Ft	11 017 072 Ft	1	8 674 860 Ft	2 342 212 Ft	11 017 072 Ft	11 017 072 Ft	0	100	11 017 072 Ft	Elektromos kisbusz, elektromos autó beszerzése	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Eszközbeszerzés költségei	Biztonságtechnikai eszközök telepítése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		5 109 400 Ft	1 379 538 Ft	6 488 938 Ft	1	5 109 400 Ft	1 379 538 Ft	6 488 938 Ft	6 488 938 Ft	0	100	6 488 938 Ft	A pályázatban megvalósuló épület és kültéri rekreációs park biztonságtechnikai eszközökkel való felszerelése.	8784 Kehidakustány dr. Kovács Lajos sétány 750/4
Immateriális javak beszerzése	Infokommunikáció fejlesztés webes eszközön.	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		15 745 000 Ft	4 251 150 Ft	19 996 150 Ft	1	15 745 000 Ft	4 251 150 Ft	19 996 150 Ft	19 996 150 Ft	0	100	19 996 150 Ft	Infokommunikáció fejlesztés webes eszközön. Egyesleges vendégátviteli szoftver beszerzés. Többnyelvű virtuális valóság applikáció fejlesztése a turisztikai attrakciókhoz, túrákhoz, digitális térkép tartalmi feltöltése.	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Képzéshoz kapcsolódó költségek	Segway vezetés technikai és tūravezető képzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		- Ft	- Ft	- Ft	1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	100	- Ft	Segway vezetés technikai és intenzív tūravezető tanfolyam, záróvizsgával. NEM ELSZÁMOLHATÓ SZABÁLYTALANSÁG MIAATT	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Képzéshoz kapcsolódó költségek	Kommunikációs és turizmus szakmai képzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerezés	Valós költség		235 000 Ft	63 450 Ft	298 450 Ft	8	1 880 000 Ft	507 600 Ft	2 387 600 Ft	2 387 600 Ft	0	100	2 387 600 Ft	Felnőtt képzés, oktatás. Tematika: hatékony kommunikáció alapjai, vendéggel való kommunikáció felsőfokon, problémás ügyek nehéz helyzetek és problémás vendéggel való bánásmód a gyakorlatban, konfliktus kezelés, vendégérdeklődéstől a foglalásig, vendégtopológia, upselling.	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerezés	Valós költség		235 000 Ft	63 450 Ft	298 450 Ft	1	235 000 Ft	63 450 Ft	298 450 Ft	298 450 Ft	0	100	298 450 Ft	Kötelező nyilvánosság	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerezés	Valós költség		4 700 000 Ft	1 269 000 Ft	5 969 000 Ft	1	4 700 000 Ft	1 269 000 Ft	5 969 000 Ft	5 969 000 Ft	0	100	5 969 000 Ft	Közbeszerzési szakértő	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Offline marketing anyagok elkészítése	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		3 937 010 Ft	1 062 990 Ft	5 000 000 Ft	1	3 937 010 Ft	1 062 990 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0	100	5 000 000 Ft	Offline marketing anyag készítése	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység, brand kialakítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Közbeszerzés	Valós költség		23 622 050 Ft	6 377 950 Ft	30 000 000 Ft	1	23 622 050 Ft	6 377 950 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0	100	30 000 000 Ft	Marketing tevékenység	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Urbán Tibor	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	Valós költség		3 637 097 Ft	- Ft	3 637 097 Ft	1	3 637 097 Ft	- Ft	3 637 097 Ft	3 637 097 Ft	0	100	3 637 097 Ft	Projektmenedzsment költségek, projekt vezető, nem elszámolható 362 903 Ft SZAB miatt	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Lázár Roland	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	Valós költség		- Ft	- Ft	- Ft	1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0	100	- Ft	Projektmenedzsment , projekt asszisztens, NEM ELSZÁMOLHATÓ SZABÁLYTALANSÁG MIAATT	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Vig Tamás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	Valós költség		3 637 097 Ft	- Ft	3 637 097 Ft	1	3 637 097 Ft	- Ft	3 637 097 Ft	3 637 097 Ft	0	100	3 637 097 Ft	Projektmenedzsment, Projekt gazdasági vezető, nem elszámolható 362 903 Ft SZAB miatt	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Beszerezés	Valós költség		6 100 000 Ft	1 647 000 Ft	7 747 000 Ft	1	6 100 000 Ft	1 647 000 Ft	7 747 000 Ft	7 747 000 Ft	0	100	7 747 000 Ft	Megvalósíthatósági tanulmány és CBA költsége	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Juhász Szabolcs	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	Valós költség		181 500 Ft	- Ft	181 500 Ft	16	2 904 000 Ft	- Ft	2 904 000 Ft	2 904 000 Ft	0	100	2 904 000 Ft	Projektmenedzsment, turisztika szakértő	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Nemes Nikoletta	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	Saját teljesítés	Valós költség		181 500 Ft	- Ft	181 500 Ft	16	2 904 000 Ft	- Ft	2 904 000 Ft	2 904 000 Ft	0	100	2 904 000 Ft	Projektmenedzsment , konzorciumi projektasszisztens	8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7 206/1
													524 250 352 Ft	524 250 352 Ft	0		524 250 352 Ft		

Március

Április

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

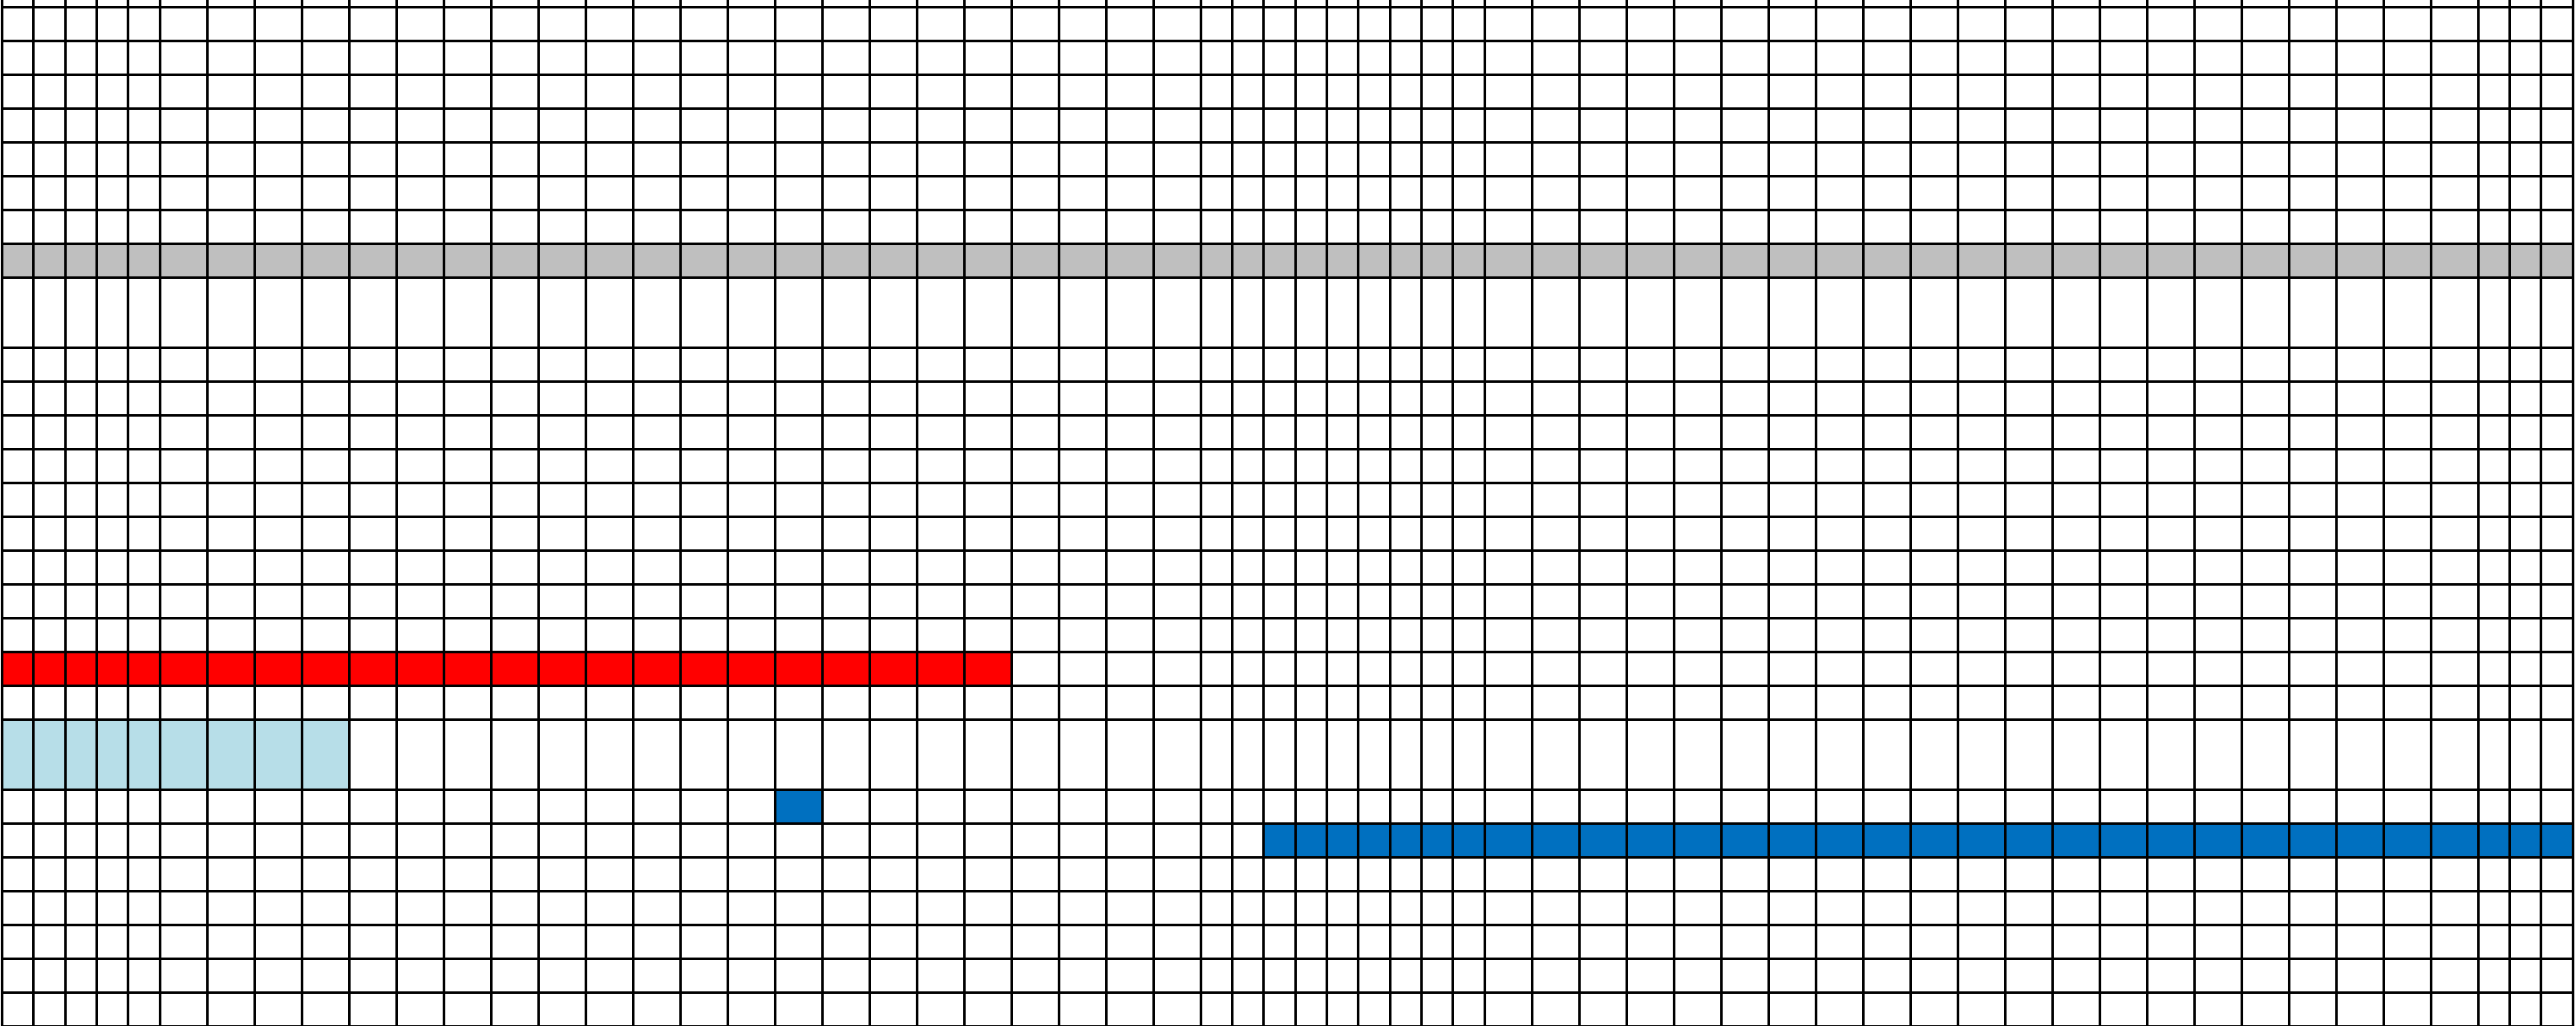

Március

Április

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

